DESCRIPTION D'UNE MISSION | BTS SIO			
Prénom – Nom	Adam Reffad	**N° mission**	5
Option	**SISR** ☒	**SLAM** ☐	
Situation	**Formation** ☐	**Entreprise** ☒	

Lieu de réalisation	227 rue de Bercy paris 12	VILLE DE PARIS
Période de réalisation	Du : 9/09/2025	Au : 29/09/2025
Modalité de réalisation	VÉCUE ☒	OBSERVÉE ☐

Intitulé de la mission	Titre de la mission **Mise en supervision de climatiseurs INROW sur Centreon**
Description du contexte de la mission	Description Nous avons des climatiseurs à mettre en supervision sur Centreon avec leur OIDs (fournit dans une MIB) associé aux métriques que nous allons interroger grâce à un agent SNMP pour obtenir des données de performances.

Ressources et outils utilisés	Liste des ressources disponibles et outils utilisés (Documentations, Matériels et Logiciels) -Le protocole SNMP, Le logiciel Centreon et l'interface graphique web de ce dernier depuis un poste Windows 11.
Résultat attendu	Résultat attendu avec la réalisation de cette mission Une supervision en temps réel de ces climatiseurs accessible depuis Centreon.
Contraintes	Contraintes : techniques | budgétaires | temps | O.S. ou outils imposés… Aucune

Compétences associées *(voir tableau)*	Liste des intitulés du tableau de compétences (avec les références) -Réflexion et patience -Administration d'un service pour un système

Description simplifiée des différentes étapes de réalisation de la mission
En mettant en évidence la démarche suivie, les méthodes et les techniques utilisées

On se connecte sur Centreon pour y insérer en supervision les climatiseurs (Il y en a 4).

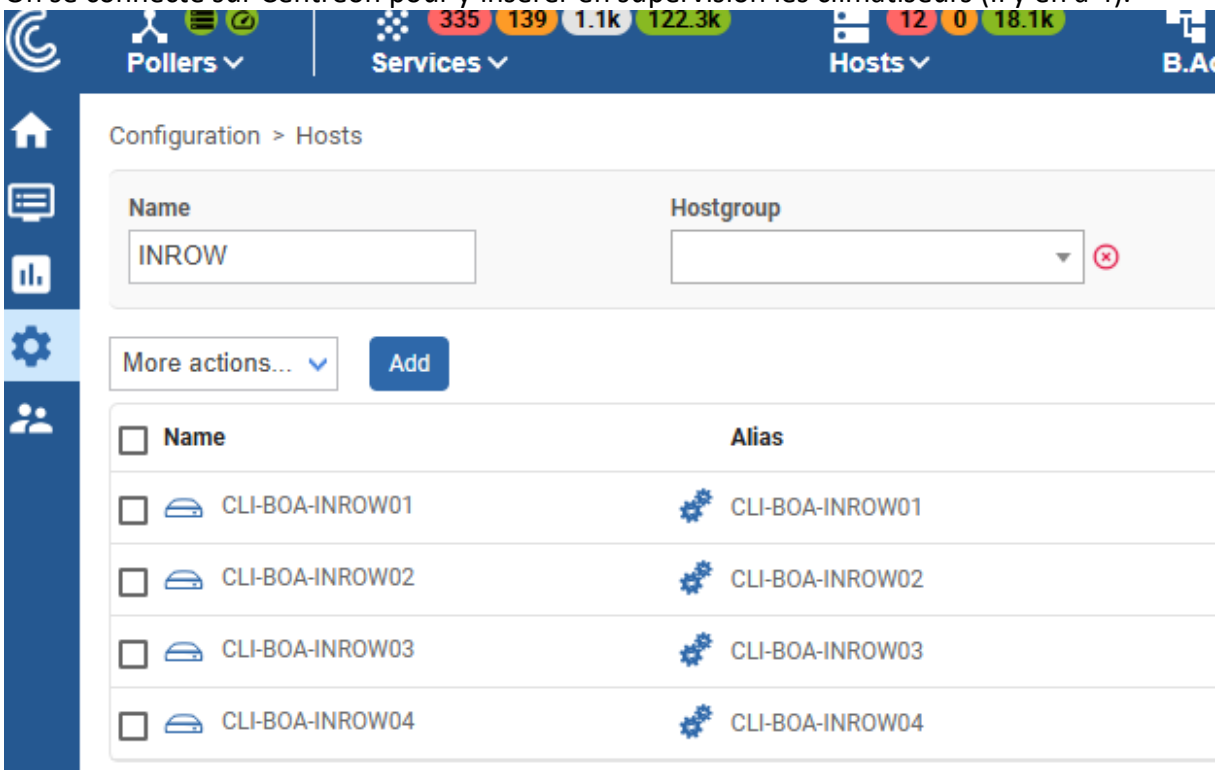

Puis on leur assigne un Template SNMP pour que les pollers puissent faire des requêtes SNMP de manière sécurisée via leur OIDs **(identifiant d'une information se rapportant à la valeur d'une métrique/point de contrôle)** directement sur Centreon afin d'obtenir une information/valeur en temps réel concernant un point de contrôle spécifique de l'activité de la machine.

Comme par exemple « la température dans l'air du froid généré, ou quand il se refroidie ou s'il est actif »

Configuration > Hosts > CLI-BOA-INROW01

Host Configuration | Notification | Relations | Data Processing | Host Extended Infos

| Modify a Host

Host basic information

Name *	CLI-BOA-INROW01
Alias	CLI-BOA-INROW01
Address *	Resolve
SNMP Community & Version	3
Monitoring server	Z81-PR-I2-POL32
Timezone	Timezone
Templates A host or host template can have several templates. See help for more details.	+ Add a new entry HW-INROW-Chilled-Water-cooling-units-SNMPv3-CASVP
Create Services linked to the Template too	Yes / No

Host check options

Check Command	Check Command
Args	
Custom macros	+ Add a new entry

Custom macros (Template inheritance / Command inheritance):

Name	Value
SNMPUSERNAME	••••••••••••
SNMPAUTHPROTOCOL	•••
SNMPAUTHPASSPHRASE	••••••••••••••••••••••••
SNMPPRIVPROTOCOL	•••
SNMPPRIVPASSPHRASE	••••••••••••••••••••••••
SNMPEXTRAOPTIONS	

Configuration > Services > Services by host

General Information | Notifications | Relations | Data Processing | Extended Info

| Modify a Service

Service Basic Information

Name * INROW-Return_Air_Temperature

Hosts * CLI-BOA-INROW01 ×

Template INROW-Return_Air_Temperature

Service Check Options

Check Command * Check Command

+ Add a new entry

Custom macros

Template inheritance
Command inheritance

Name	Value	Pass
OID	1.3.6.1.4.1.318.1.1.27.1.4.1.2.1.3.1	
FORMAT	current value is %s °C	
WARNING		
CRITICAL		
EXTRAOPTIONS	--format-custom='/10'	
TICKET_ID		

Nous trouvons ces OIDs grâce à une documentation trouvable en ligne sur le site du constructeur qu'on appelle une MIB

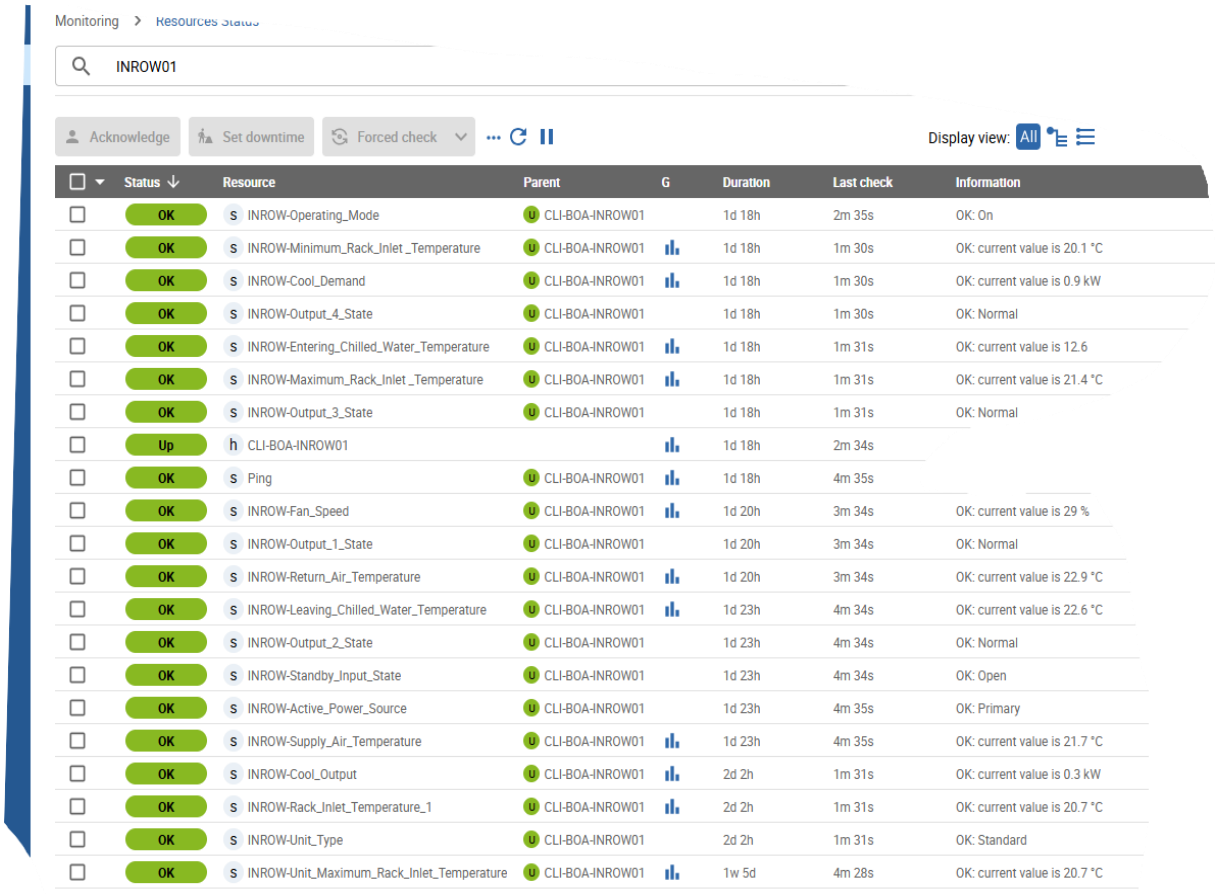

Status	Resource	Parent	G	Duration	Last check	Information
OK	INROW-Operating_Mode	CLI-BOA-INROW01		1d 18h	2m 35s	OK: On
OK	INROW-Minimum_Rack_Inlet _Temperature	CLI-BOA-INROW01		1d 18h	1m 30s	OK: current value is 20.1 °C
OK	INROW-Cool_Demand	CLI-BOA-INROW01		1d 18h	1m 30s	OK: current value is 0.9 kW
OK	INROW-Output_4_State	CLI-BOA-INROW01		1d 18h	1m 30s	OK: Normal
OK	INROW-Entering_Chilled_Water_Temperature	CLI-BOA-INROW01		1d 18h	1m 31s	OK: current value is 12.6
OK	INROW-Maximum_Rack_Inlet _Temperature	CLI-BOA-INROW01		1d 18h	1m 31s	OK: current value is 21.4 °C
OK	INROW-Output_3_State	CLI-BOA-INROW01		1d 18h	1m 31s	OK: Normal
Up	CLI-BOA-INROW01			1d 18h	2m 34s	
OK	Ping	CLI-BOA-INROW01		1d 18h	4m 35s	
OK	INROW-Fan_Speed	CLI-BOA-INROW01		1d 20h	3m 34s	OK: current value is 29 %
OK	INROW-Output_1_State	CLI-BOA-INROW01		1d 20h	3m 34s	OK: Normal
OK	INROW-Return_Air_Temperature	CLI-BOA-INROW01		1d 20h	3m 34s	OK: current value is 22.9 °C
OK	INROW-Leaving_Chilled_Water_Temperature	CLI-BOA-INROW01		1d 23h	4m 34s	OK: current value is 22.6 °C
OK	INROW-Output_2_State	CLI-BOA-INROW01		1d 23h	4m 34s	OK: Normal
OK	INROW-Standby_Input_State	CLI-BOA-INROW01		1d 23h	4m 34s	OK: Open
OK	INROW-Active_Power_Source	CLI-BOA-INROW01		1d 23h	4m 35s	OK: Primary
OK	INROW-Supply_Air_Temperature	CLI-BOA-INROW01		1d 23h	4m 35s	OK: current value is 21.7 °C
OK	INROW-Cool_Output	CLI-BOA-INROW01		2d 2h	1m 31s	OK: current value is 0.3 kW
OK	INROW-Rack_Inlet_Temperature_1	CLI-BOA-INROW01		2d 2h	1m 31s	OK: current value is 20.7 °C
OK	INROW-Unit_Type	CLI-BOA-INROW01		2d 2h	1m 31s	OK: Standard
OK	INROW-Unit_Maximum_Rack_Inlet_Temperature	CLI-BOA-INROW01		1w 5d	4m 28s	OK: current value is 20.7 °C

Une fois que toutes les infos sont rentrées, nous pouvons constater dans le statut des ressources que la supervision est en vigueur et nous avons les données en temps réel.

Conclusion	Que pouvez-vous dire de cette mission : apport personnel, expérience, etc
	Cela m’a permis de mieux comprendre l’utilité et le fonctionnement du protocole SNMP.

Productions associées	Liste des documents produits et description
	La MIB
