Pose d'une prise (connecteur) RJ45 | **BTS SIO**			
Prénom – Nom	Adam Reffad	**N° mission**	2
Option	**SISR** ☒	**SLAM** ☐	
Situation	**Formation** ☒	**Entreprise** ☐	

Lieu de réalisation	CFA Cerfal Campus Montsouris	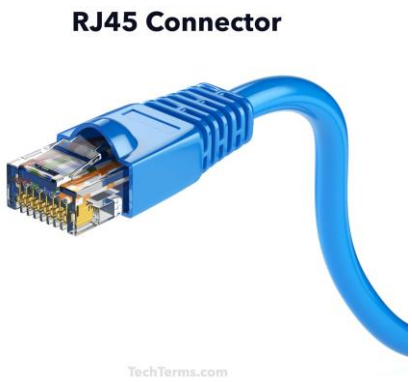
Période de réalisation	Du : 28/11/2025	Au : 28/11/2025
Modalité de réalisation	VÉCUE ☒	OBSERVÉE ☐

Intitulé de la mission	Titre de la mission Changement de connecteur RJ45
Description du contexte de la mission	Description en 2 à 3 lignes maxi Le formateur nous a mis à disposition des câbles avec des connecteurs RJ45 cassés et on devait les changer pour faire fonctionner le câble Ethernet et permettre la connexion via RJ45.

Ressources et outils utilisés	Liste des ressources disponibles et outils utilisés (Documentations, Matériels et Logiciels) Câble Ethernet et connecteur RJ45 (tête)
Résultat attendu	Résultat attendu avec la réalisation de cette mission **Pouvoir comprendre le fonctionnement d'une prise de câble Ethernet afin de savoir comment changer la prise en cas de panne ou de fissure.** **Comprendre aussi la norme de connexion.**
Contraintes	Contraintes : techniques | budgétaires | temps | O.S. ou outils imposés… **Nous n'avions que 5H ou 6H pour le faire et il y avait peu de connecteur RJ45 de rechange**

Compétences associées *(voir tableau)*	Liste des intitulés du tableau de compétences (avec les références) Gérer le patrimoine informatique !

Description simplifiée des différentes étapes de réalisation de la mission
en mettant en évidence la démarche suivie, les méthodes et les techniques utilisées

Dans un premier temps, une phase de **préparation du câble Ethernet** est réalisée. Elle consiste à couper proprement l'extrémité abîmée du câble afin de repartir sur une base saine.

Ensuite, on procède au **dénudage du câble**. Cette étape permet de retirer la gaine extérieure pour accéder aux fils internes, qui sont organisés en paires torsadées. Ces fils sont ensuite séparés, redressés et ordonnés.

La troisième étape consiste à **respecter la norme de câblage (T568A ou T568B)**. Les fils doivent être positionnés dans un ordre précis afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau. Cette étape est essentielle pour éviter les erreurs de connexion.

Une fois les fils correctement alignés, on réalise le **sertissage du connecteur RJ45**. Les fils sont insérés dans la prise RJ45, puis fixés à l'aide d'une pince à sertir, ce qui permet d'assurer un bon contact électrique.

Après cela, une **vérification visuelle et mécanique** est effectuée. Elle permet de s'assurer que les fils sont bien positionnés, que la prise est correctement fixée et qu'aucun défaut n'est visible.

Enfin, la dernière étape consiste en une **validation avec un testeur de câble**. Ce test permet de s'assurer que la connexion fonctionne correctement, sans erreur de câblage.

Conclusion	Que pouvez-vous dire de cette mission : apport personnel, expérience, etc Ça nous plonge dans la pratique manuelle de l'électronique et de la connaissance des 2 normes différentes RJ45 (**T568A et T568B**) Mais je n'ai pas trop apprécié due au caractère très manuelle et industrielle.

Evolution possible *(facultatif)*	Evolution du service concerné par cette mission qui pourrait être envisagée Il y a maintenant des robots qui le font à notre place

Productions associées	Liste des documents produits et description
